

COMUNITA' MONTANA ALENTO MONTESTELLA
(Provincia di Salerno)

**LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI VASCHE PER
LA RACCOLTE DELLE ACQUE AD UTILIZZO ANTINCENDIO**

PSR 2014/2020 MISURA 8

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Sottomisura 8.3.1

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

TIPOLOGIA 8.3.1

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alleforeste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Tav. 33	PROGETTO ESECUTIVO
data: agg.:	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI


I TECNICI
Ing. Luigi Vaccaro



R.U.P.
Geom. Floriano Malandrino

N. ord.	Cod.		Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A		Consegna dei lavori	29/11/2021	29/11/2022	365
2	B	Sessa Cilento	Pulizia e installazione area cantiere	30/11/2021	10/12/2021	10
3	C		Ripristino vasca esistente	09/12/2021	17/02/2022	70
4			Realizzazione condotta idrica e Sistemazione viabilità	15/02/2022	07/03/2022	20
5			Ripristino recinzione e smobilizzo cantiere	05/03/2022	25/03/2022	20
6		Stella Cilento	Pulizia area di cantiere e demolizione vasca	20/03/2022	29/04/2022	40
7	D		Realizzazione opere di scavo	15/04/2022	04/06/2022	50
8			Realizzazione opere in c.a. e opere idrauliche	01/04/2022	10/07/2022	100
9			Realizzazione opere di recinzione sistemazione viabilità e pulizia cantiere	09/06/2022	08/08/2022	60
10		San Mauro Cilento	Pulizia area di cantiere	08/08/2022	28/08/2022	20
11			Realizzazione opere di scavo	20/08/2022	29/09/2022	40
12			Realizzazione opere in c.a. e opere idrauliche	21/08/2022	20/10/2022	60
13			Realizzazione opere di recinzione sistemazione viabilità	25/08/2022	04/10/2022	40
14			Pulizia cantiere	01/10/2022	21/10/2022	20
15		Cicerale	Pulizia area e demolizione vasca	09/12/2021	08/01/2022	30
16			Realizzazione opere di scavo	20/12/2021	10/03/2022	80
17			Realizzazione opere in c.a.	10/02/2022	21/05/2022	100
18			Realizzazione opere di recinzione sistemazione viabilità e pulizia cantiere	20/05/2022	08/08/2022	80
19		Casal Velino	Pulizia e installazione area di cantiere	09/07/2022	29/07/2022	20
20			Realizzazione opere di scavo	10/07/2022	09/08/2022	30
21	E		Realizzazione opere in c.a.	08/08/2022	06/11/2022	90
22	F		Realizzazione opere di recinzione sistemazione viabilità e pulizia cantiere	05/11/2022	29/11/2022	24

DURATA (gg)

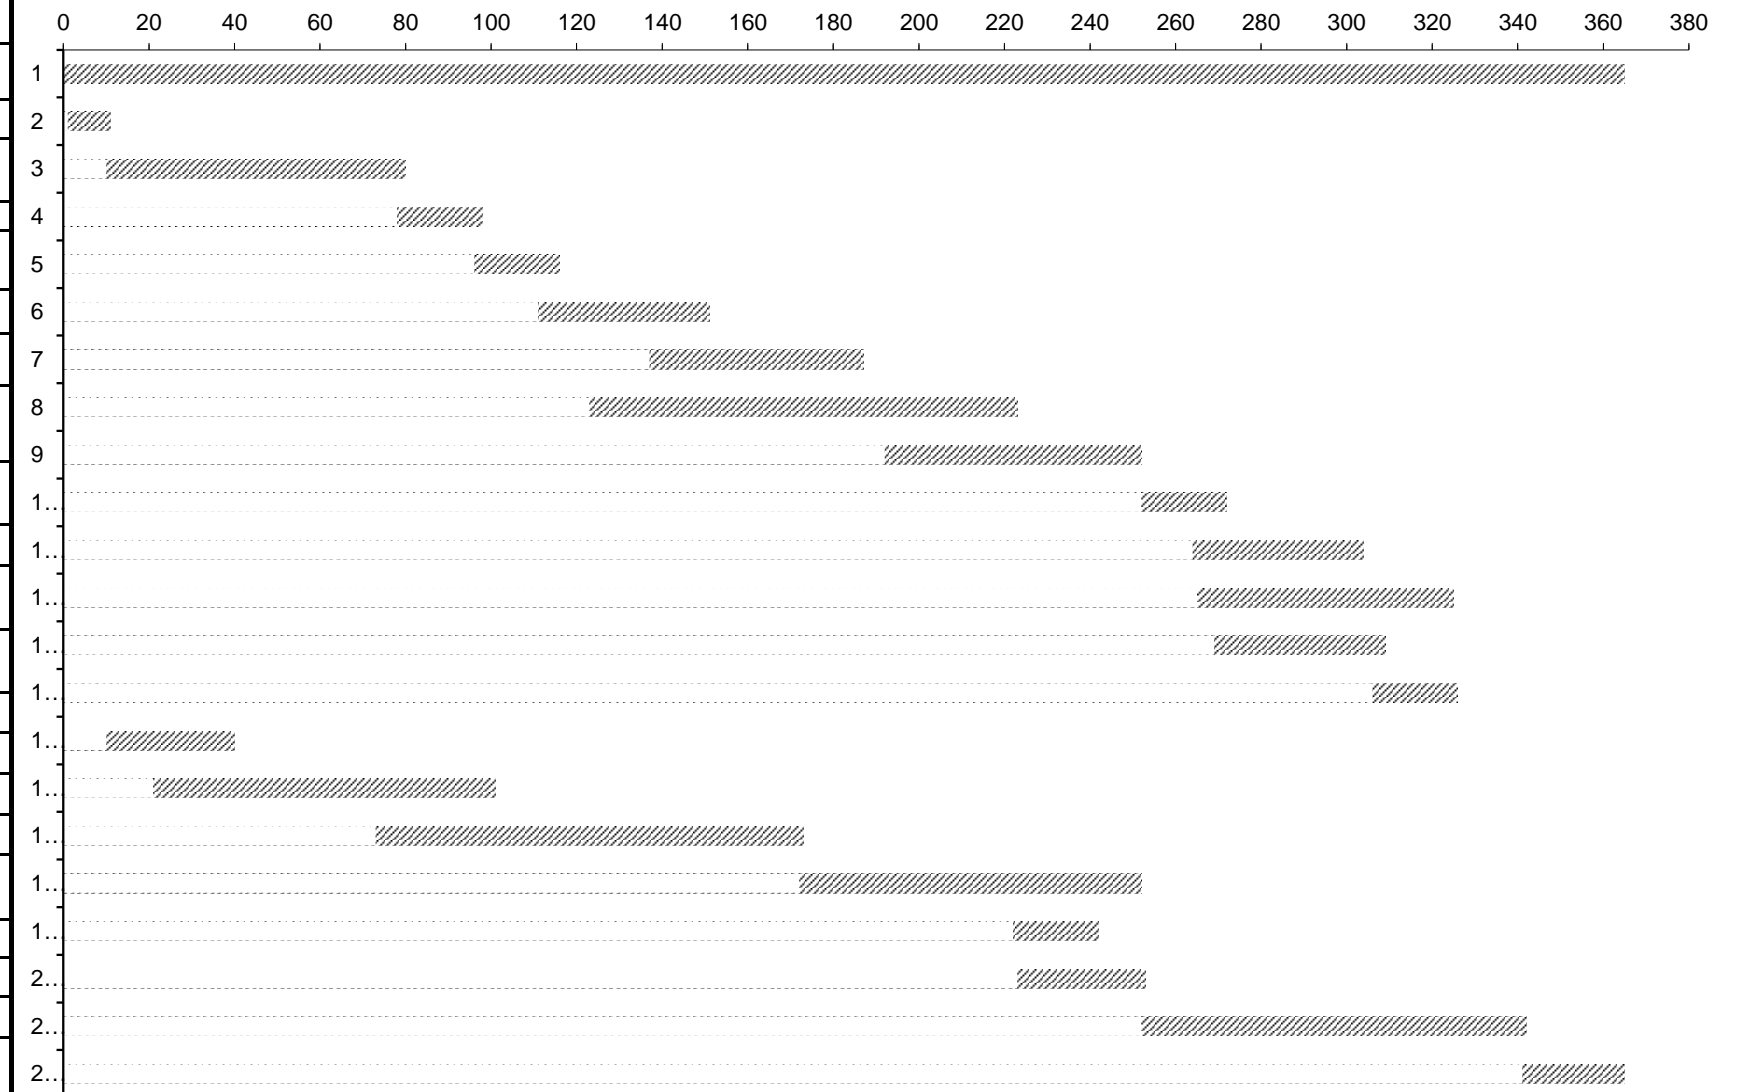

Inizio dei lavori
29/11/2021

Fine lavori
29/11/2022

TC

365

gg. naturali consecutivi
